


**Installationsanzeige Gasversorgung Schlieren**

Liegenschaft:							
<input type="checkbox"/> Bauherr <input type="checkbox"/> Verwalter:							
Architekt:							
Installateur:							
Art der Arbeit: <input type="checkbox"/> Neuinstallation <input type="checkbox"/> Auswechslung von Gas auf Gas <input type="checkbox"/> Erweiterung <input type="checkbox"/> Auswechslung von Oel auf Gas <input type="checkbox"/> Umänderung / Demontage					Die vollständig ausgefüllte Anzeige ist mit den erforderlichen Unterlagen im Doppel einzureichen.		
Anz.	Apparate	Fabrikat/Typ	Anschlussleistung		Gebr. (G) Neu (N) Ausw. (A)	Standort und Bemerkungen	
			kW	m ³ /h			
	Heizkessel				Heizung <input type="checkbox"/> Gas <input type="checkbox"/> 2-Stoff <input type="checkbox"/> kondensierend <input type="checkbox"/>		
	Brenner				atmosphärisch <input type="checkbox"/> gebläsegestützt <input type="checkbox"/> Warmwasser <input type="checkbox"/>		
Zähler Typ:		Nr.:		Standort:		*bleibt/neu:	
Total bestehende Apparate:			Total m ³ /h:		Bemerkungen:		
Hausanschlussleitung Ø :							
Innenleitung vor dem Zähler Ø :							
Hauptahn: vorhanden <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Ø:							
Typ <input type="checkbox"/> Kugelhahn <input type="checkbox"/> Fire Safe <input type="checkbox"/> Schieber <input type="checkbox"/> Reiber							
Druckregler: vorhanden <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Ø:							
Angeschlossene Apparate am Kaminzug (Gas- und andere Brennstoffe):							
Abgasrohr Ø:		Frischluftöffnung: Q _N in KW x 6 = cm ² :					
Zuluft: <input type="checkbox"/> Kanal <input type="checkbox"/> direkt auf Gerät <input type="checkbox"/> mech. cm ² in Fenster cm ² oben in Tür cm ² unten in Tür							
Kamin (Querschnitt, Ausführung, Sanierung):							
<input type="checkbox"/> Die vorgenannten Arbeiten werden voraussichtlich bis fertiggestellt und dann zur Abnahme gemeldet.					Allgemein gültige Bestimmungen werden auf den Eingaben nicht speziell vermerkt.		
<input type="checkbox"/> Die vorgenannten Arbeiten sind bereits ausgeführt.							
Stempel und Unterschrift der Installationsfirma:							
Datum:							
Ausführung genehmigt unter Vorbehalt der übrigen einschlägigen Vorschriften der Gasversorgung Schlieren.							
Schlieren, den				Installationskontrolle			

Schema (evt. separater Plan) mit Angaben über Leitungslängen, Druckverlustberechnung, minimalen Abgabedruck, minimale und maximale Belastung.

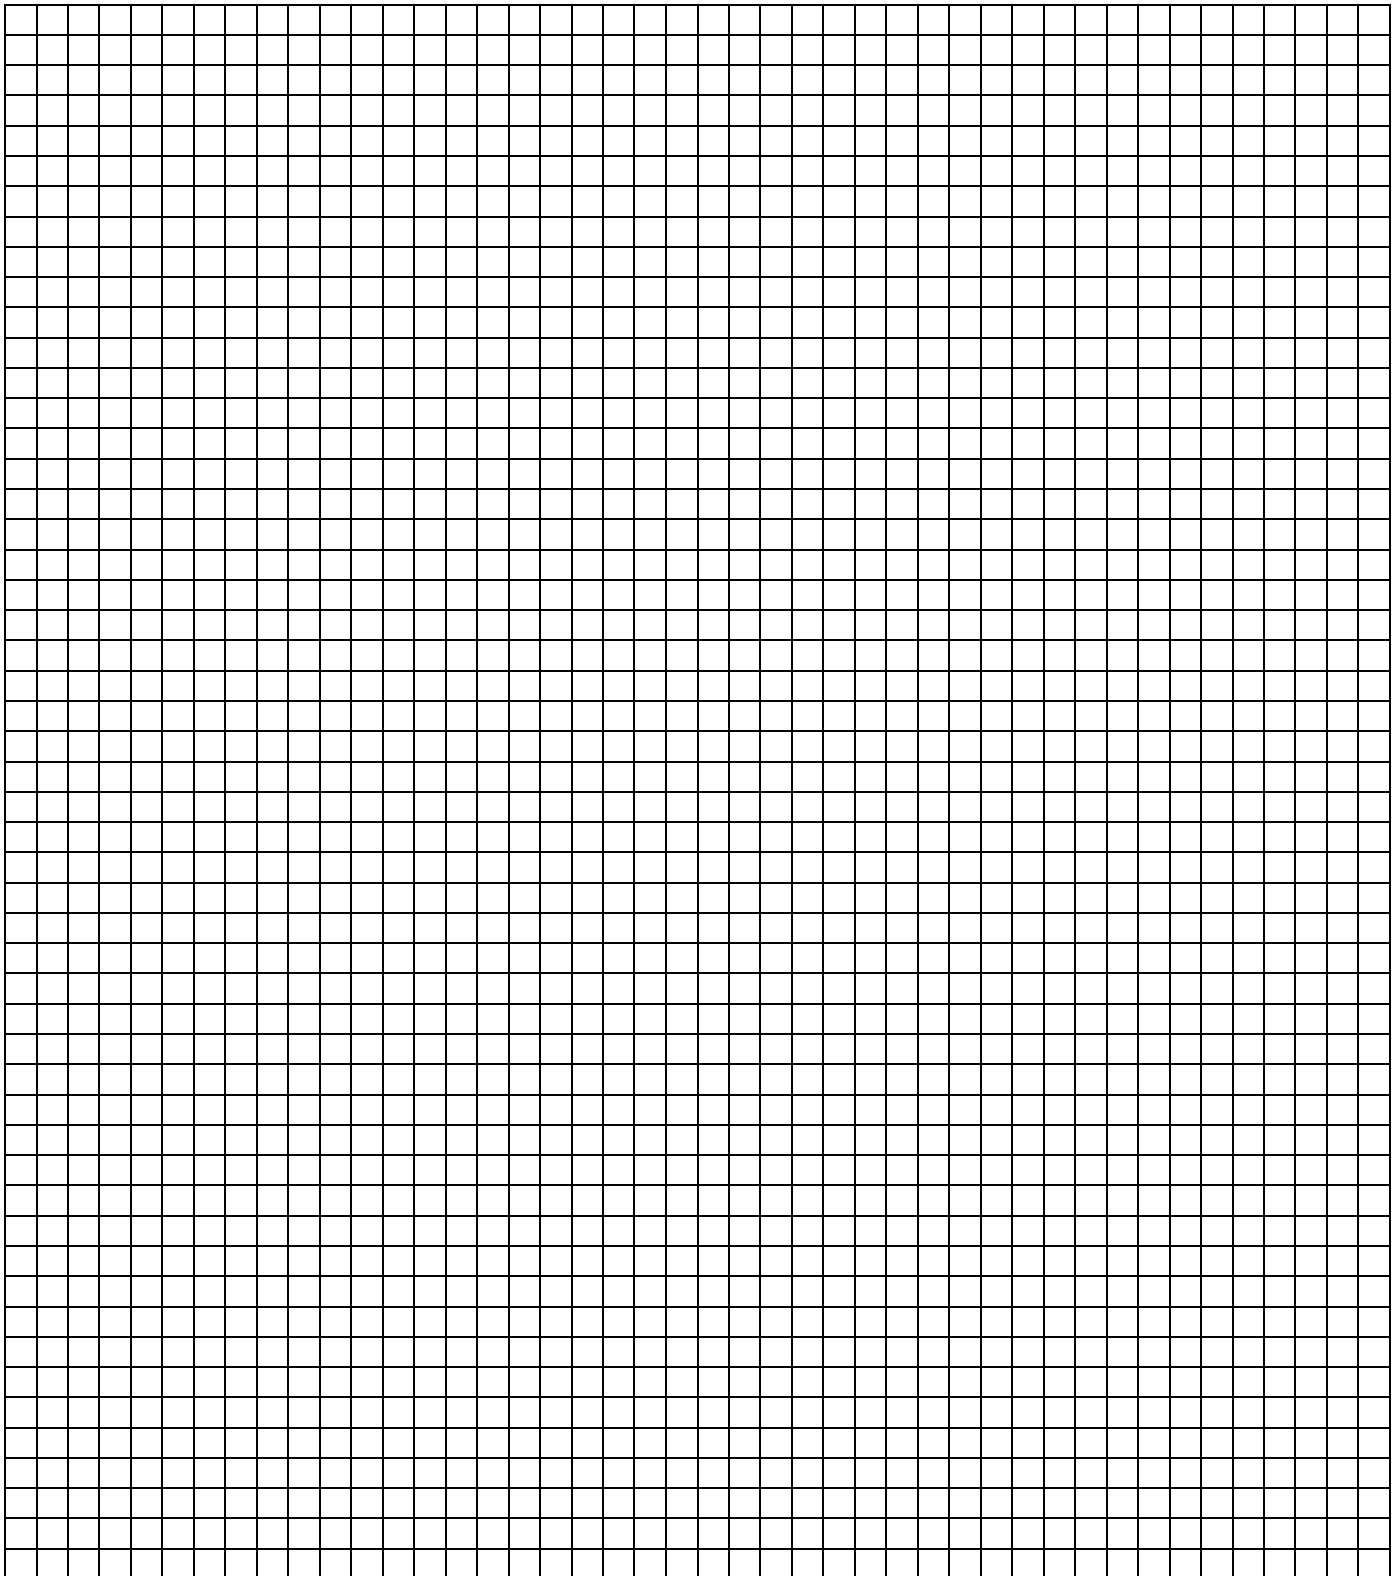

Zur Beachtung

Die Gasinstallationen sind in ihrem ganzen Umfange dem Regelwerk des SVGW (Schweizerischen Verein des Gas- und Wasserfaches) anzupassen. Insbesondere ist es Sache des Installateurs, neu angeschlossene Apparate wie Wassererwärmer, Kochherde, Durchflusswassererwärmer etc. einzuregulieren. Grösse und Standort des Gasmessers werden vom Werk bestimmt; es ist daher vor Beginn der Installationsarbeiten Rücksprache mit dem Werk erforderlich.
